




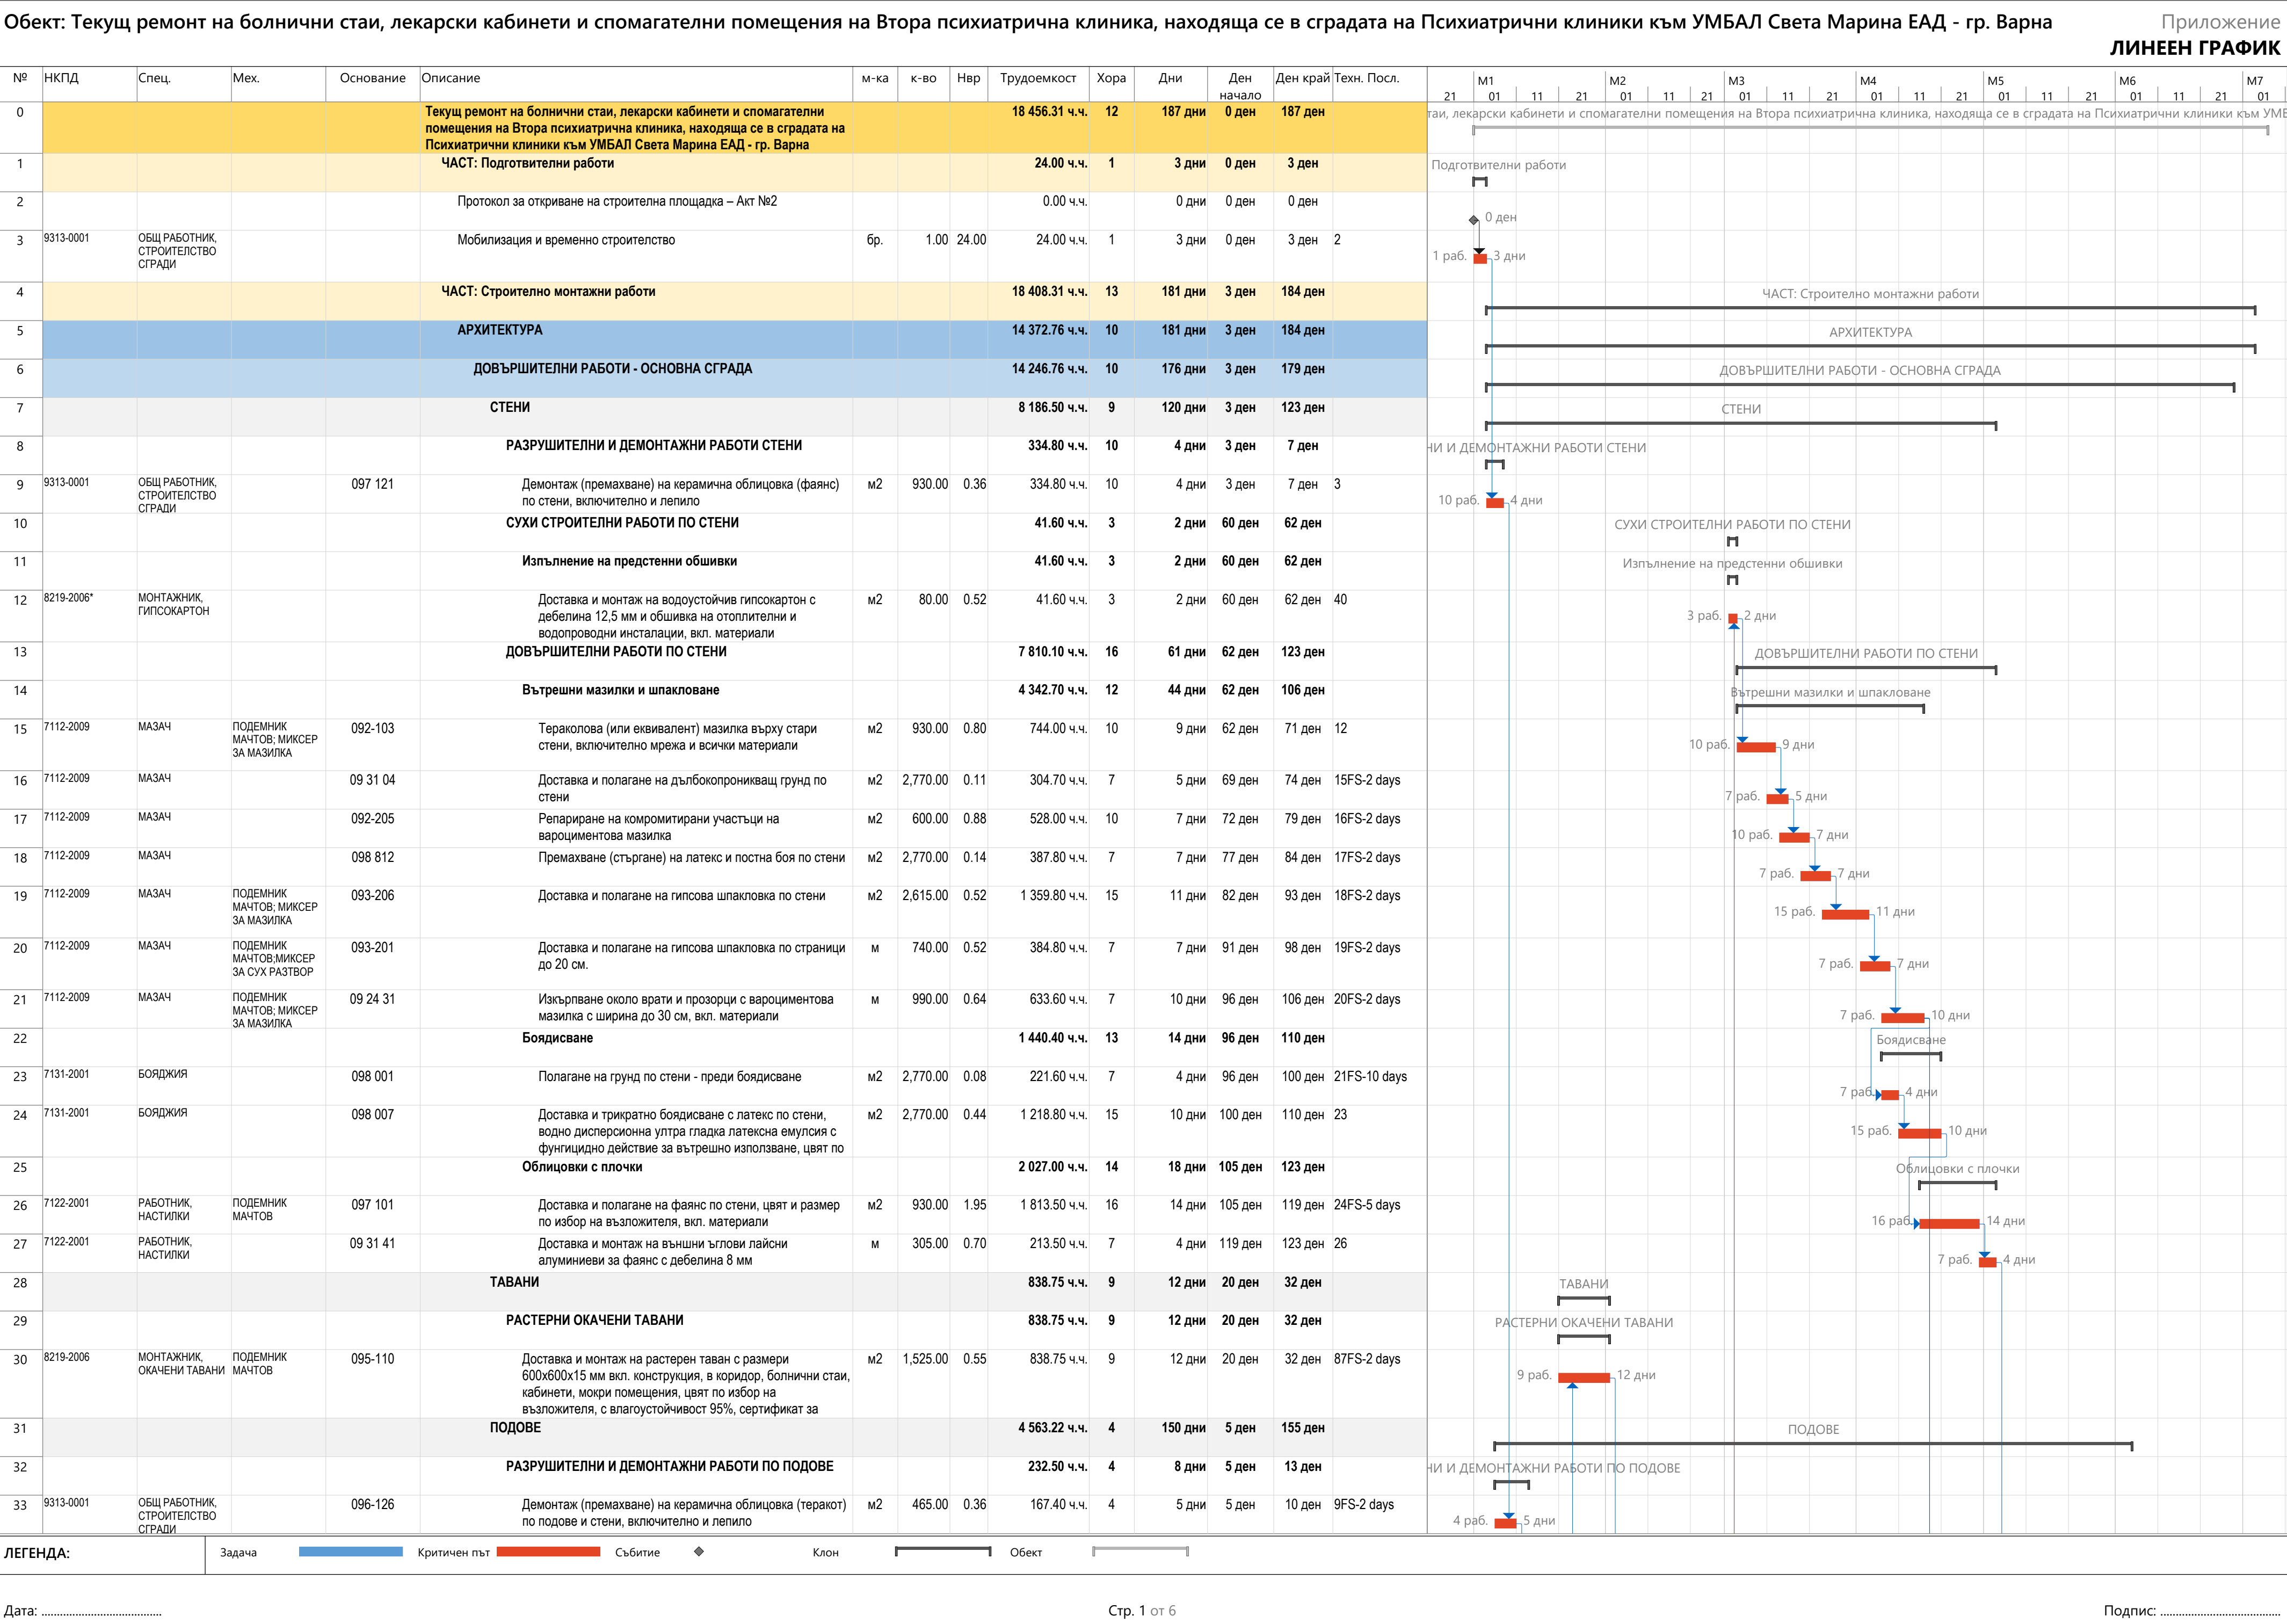

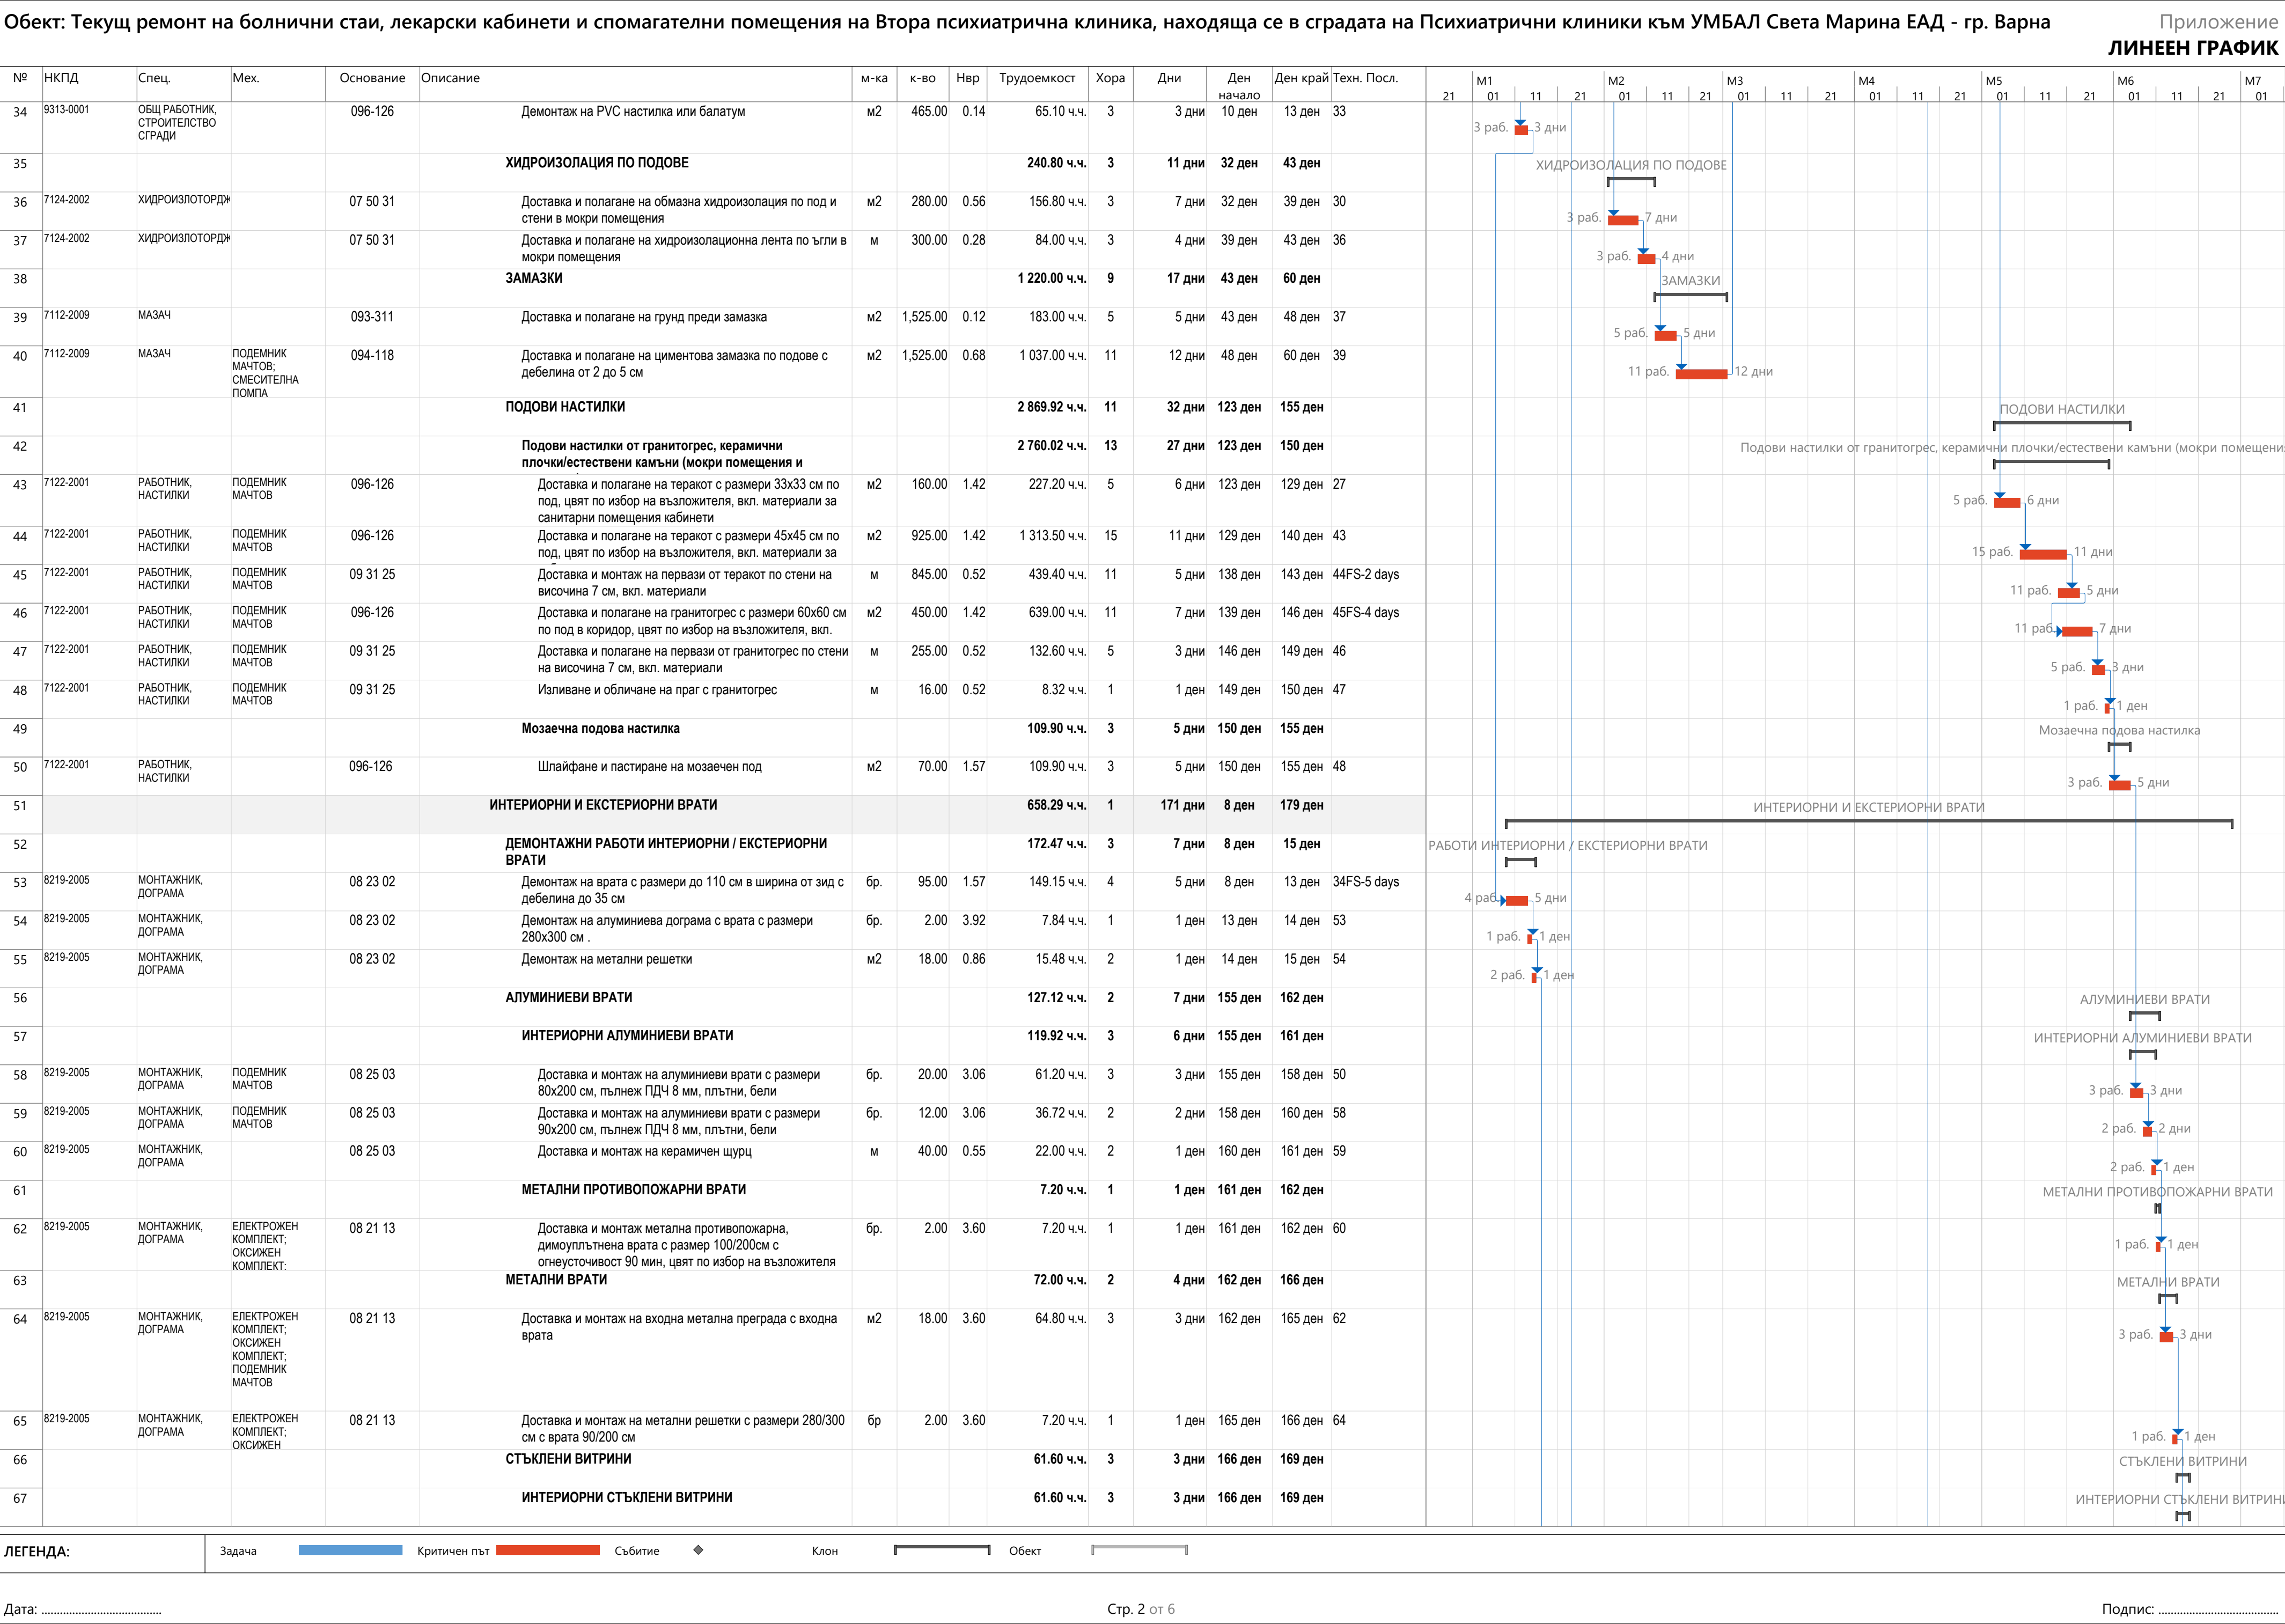

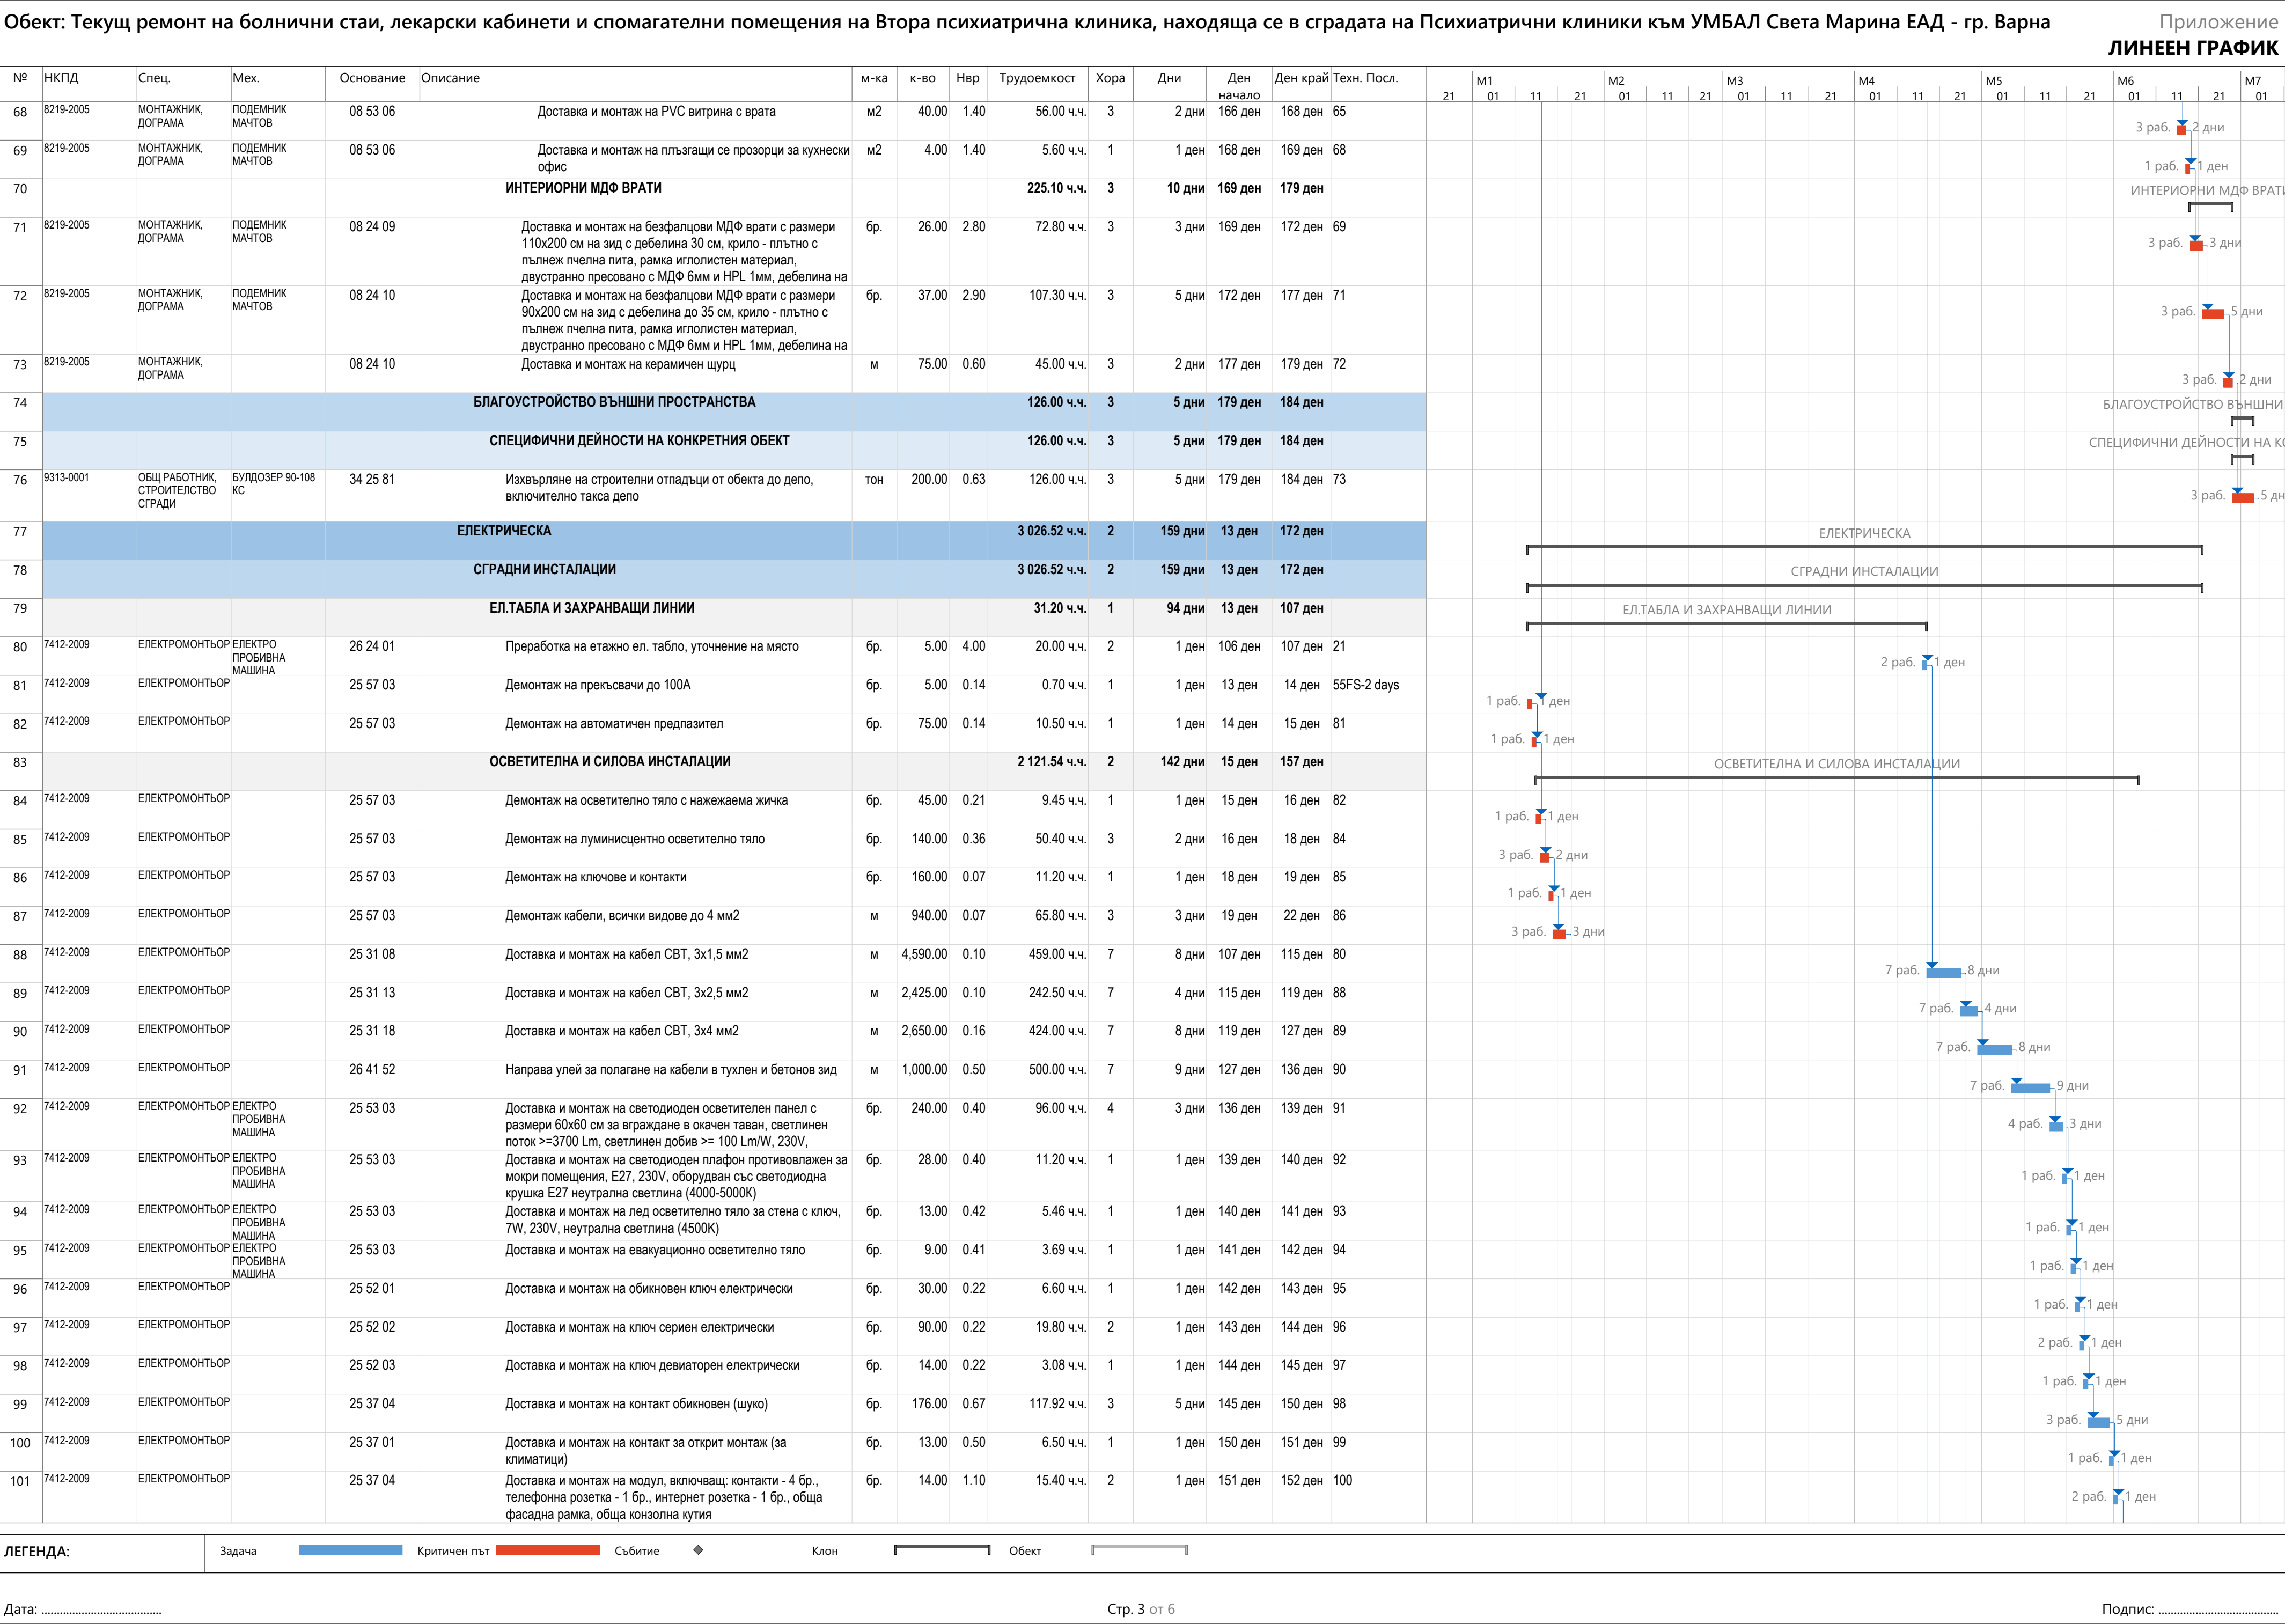

[illegible]

ЛЕГЕНДА:

Задача

Page 10 of 10

Критичен път

Событие

K

DH

Обект

Дата:

Стр. 5 от 6

Подпись:

Обект: Текущ ремонт на болнични стаи, лекарски кабинети и спомагателни помещения на Втора психиатрична клиника, находяща се в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна

Приложение
ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	НКПД	Спец.	Мех.	Основание	Описание	м-ка	к-во	Нвр	Трудоемкост	Хора	Дни	Ден начало	Ден край	Техн. Посл.		M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7
174	7126-2002	ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВИК		УСН 05-55-084	Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори	бр.	50.00	0.80	40.00 ч.ч.	3	2 дни	136 ден	138 ден	173																										
175					ОВиК				153.30 ч.ч.	3	6 дни	138 ден	144 ден																											
176					СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ				153.30 ч.ч.	3	6 дни	138 ден	144 ден																											
177					ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ				153.30 ч.ч.	3	6 дни	138 ден	144 ден																											
178	7126-2010	МОНТАЖНИК, ВЕНТИЛАЦИОННИ ТРЪБИ		23 42 04	Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни възли с клапа - 90 м3/h; 15Pa; 30W; 230V	бр.	23.00	0.80	18.40 ч.ч.	2	1 ден	138 ден	139 ден	174																										
179	7126-2010	МОНТАЖНИК, ВЕНТИЛАЦИОННИ ТРЪБИ		23 42 04	Доставка и монтаж на пускател за вентилатор (монофазен, автоматичен - до 0,2 kW)	бр.	23.00	0.80	18.40 ч.ч.	2	1 ден	139 ден	140 ден	178																										
180	7126-2010	МОНТАЖНИК, ВЕНТИЛАЦИОННИ ТРЪБИ		22 22 10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ø110 (комплект със скоби за окачване)	м	80.00	1.26	100.80 ч.ч.	5	3 дни	140 ден	143 ден	179																										
181	7126-2010	МОНТАЖНИК, ВЕНТИЛАЦИОННИ ТРЪБИ		22 22 10	Направа отвор в тухлена стена.	бр.	10.00	1.57	15.70 ч.ч.	2	1 ден	143 ден	144 ден	180																										
182					ЧАТ: Заключителни работи				24.00 ч.ч.	1	3 дни	184 ден	187 ден																											
183	9313-0001	ОБЩ РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО СГРАДИ			Демобилизация премахване на временното селище	бр.	1.00	24.00	24.00 ч.ч.	1	3 дни	184 ден	187 ден	76,145,181																										
184					Констативен акт - за установяване годността за приемане на строежа				0.00 ч.ч.		0 дни	187 ден	187 ден	183																										

ЛЕГЕНДА:

Задача

Критичен път

Събитие

Клон

Обект

Дата:

Стр. 6 от 6

Подпис:
