






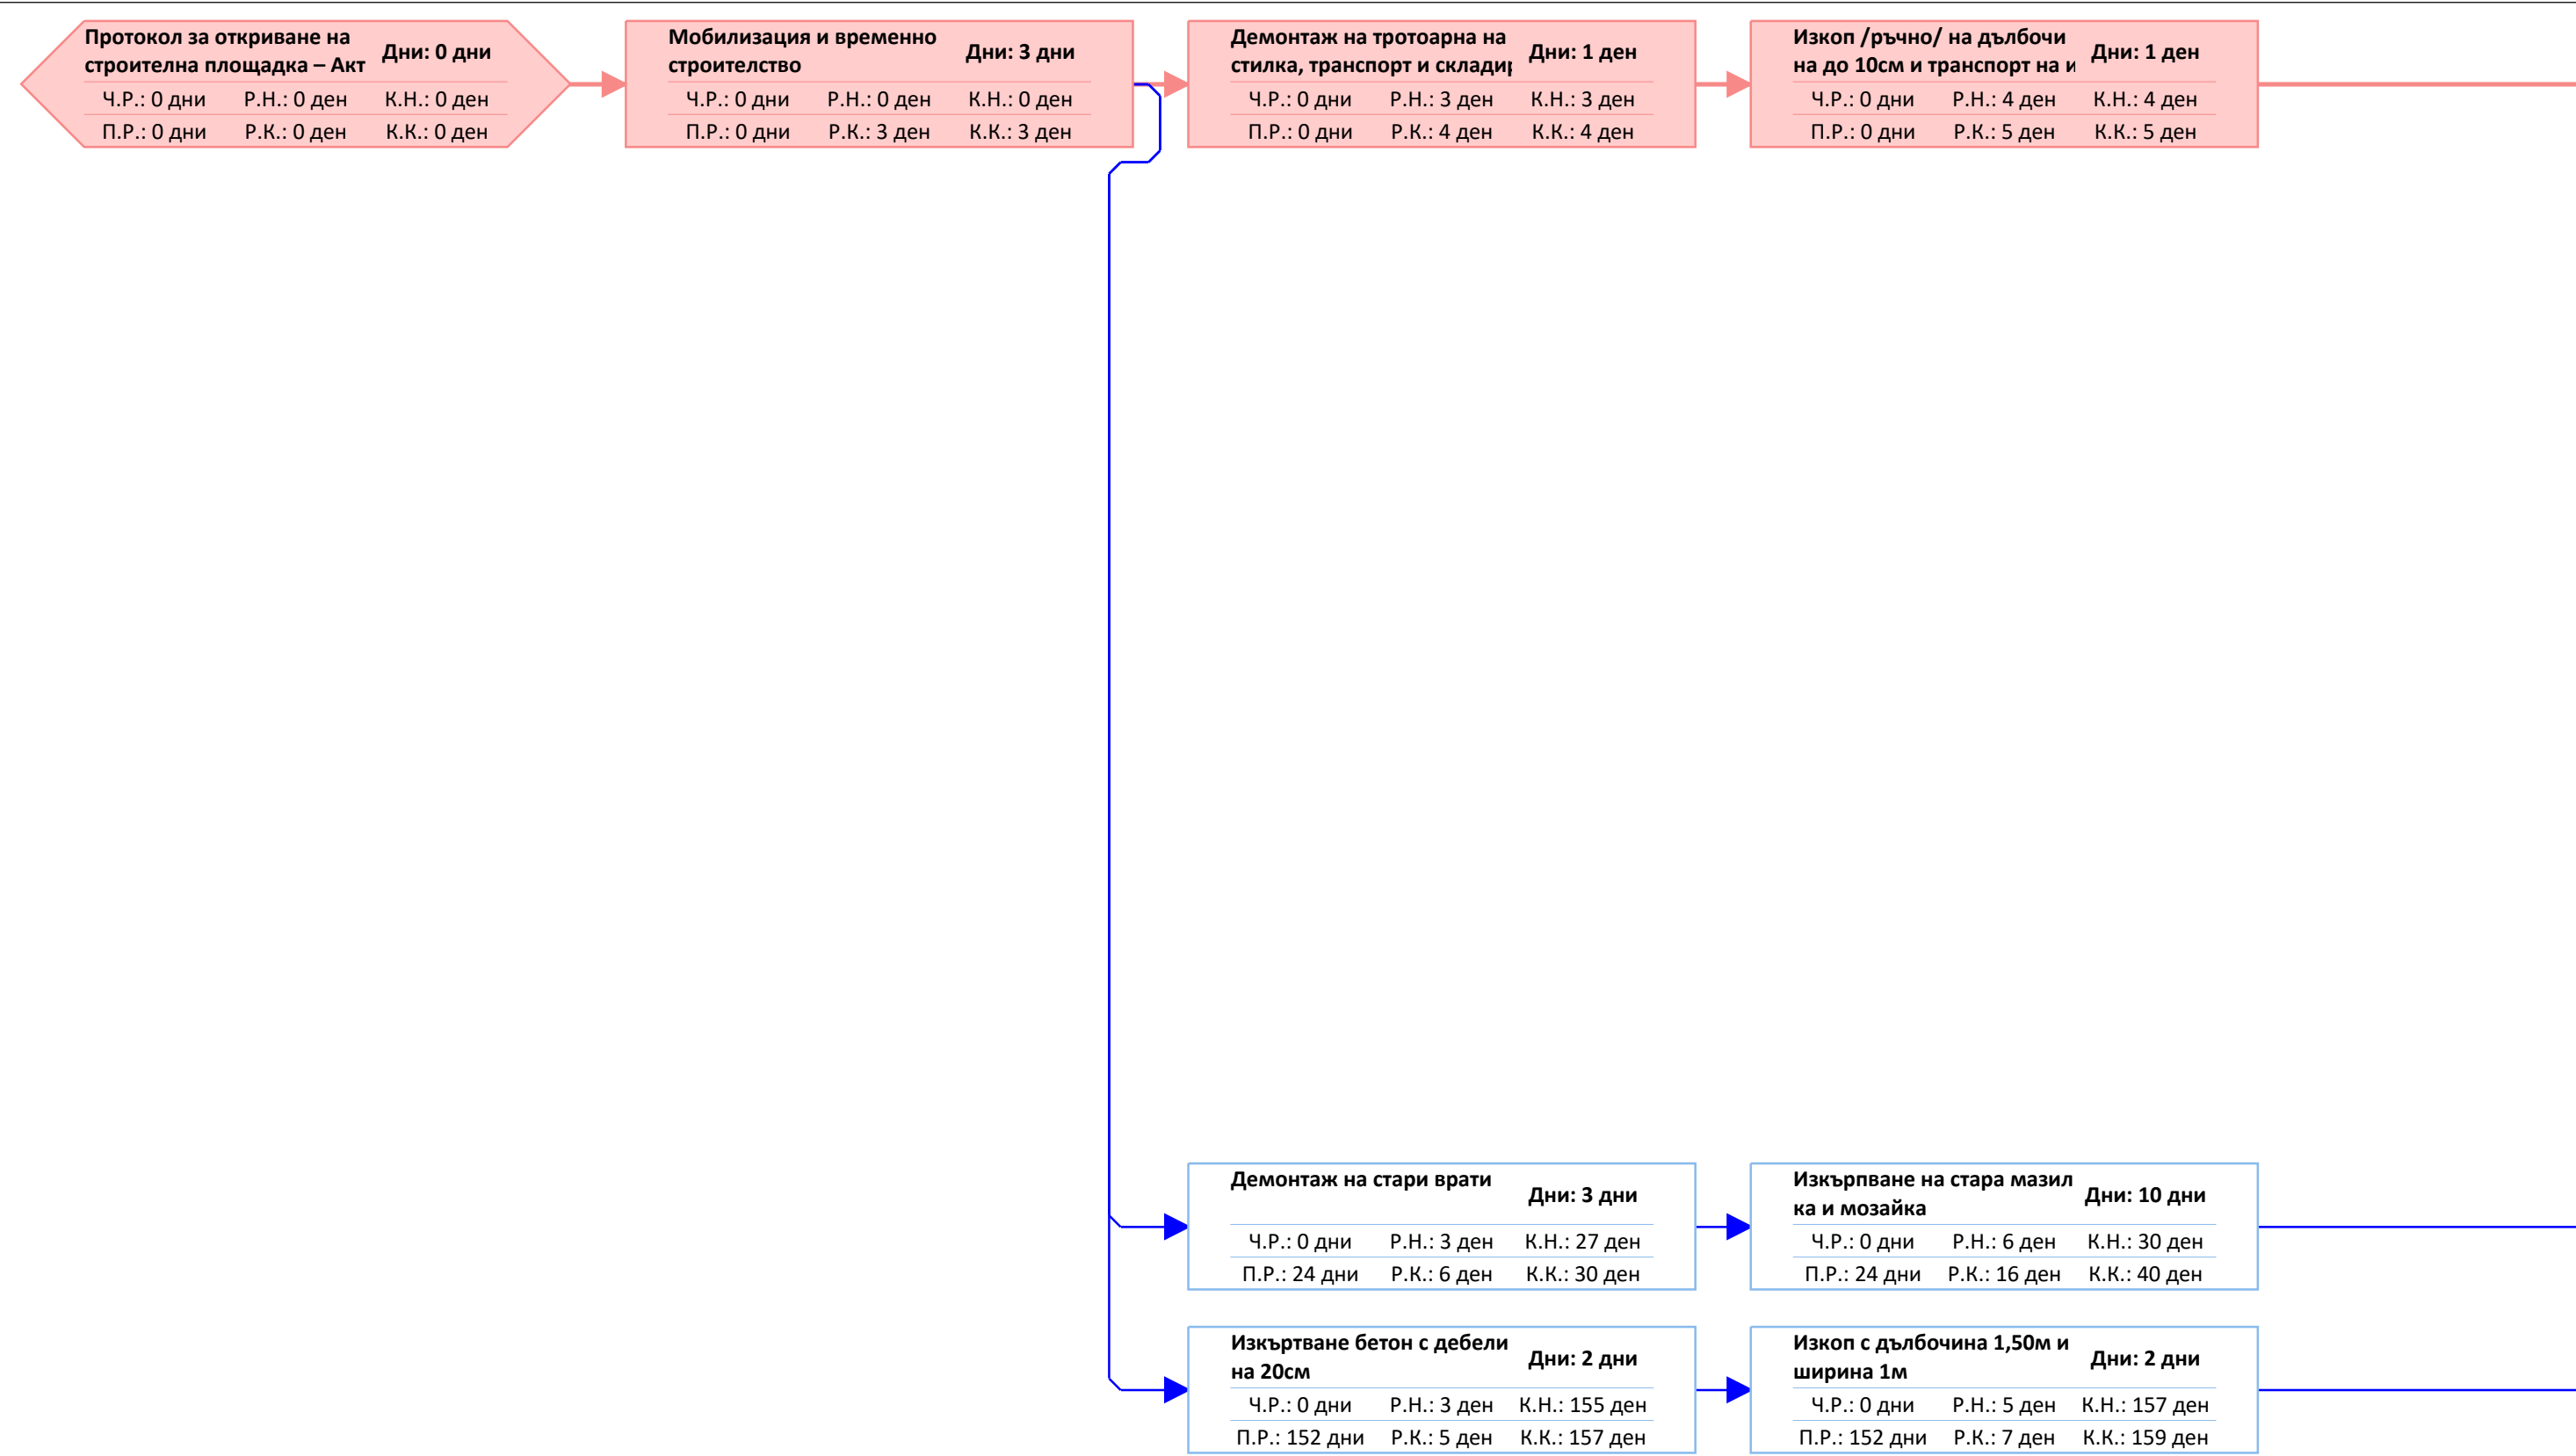

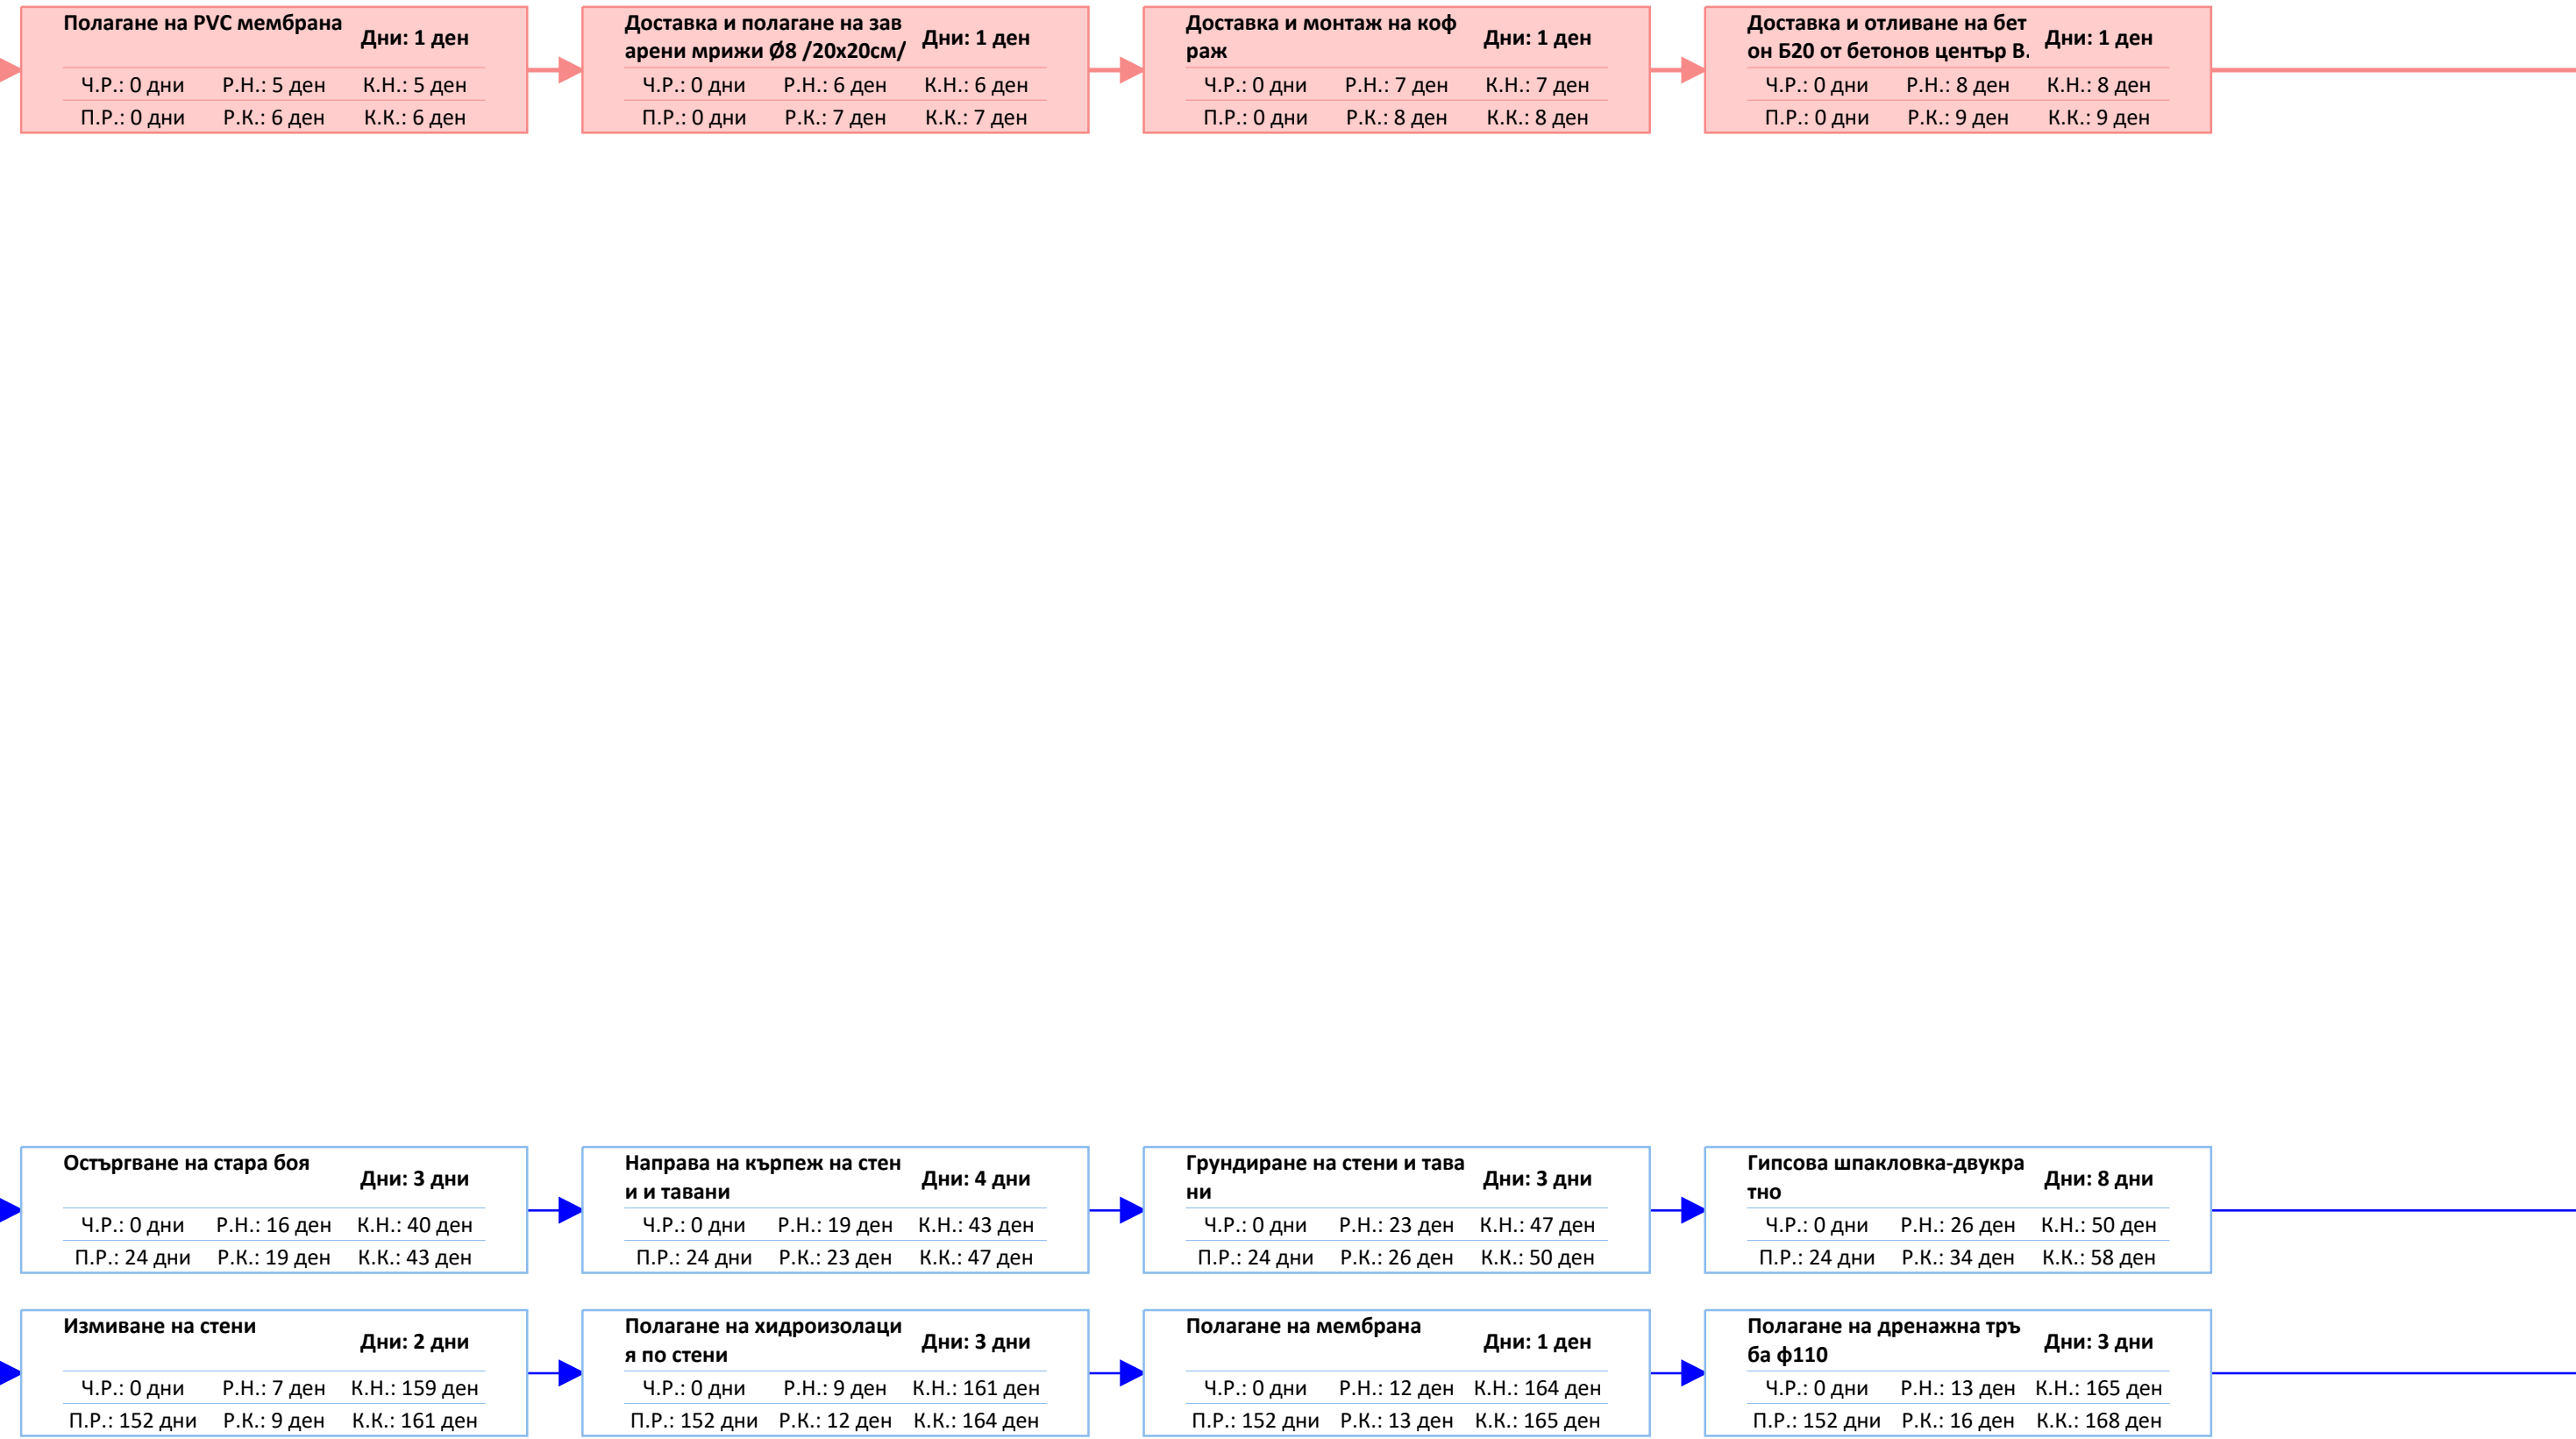

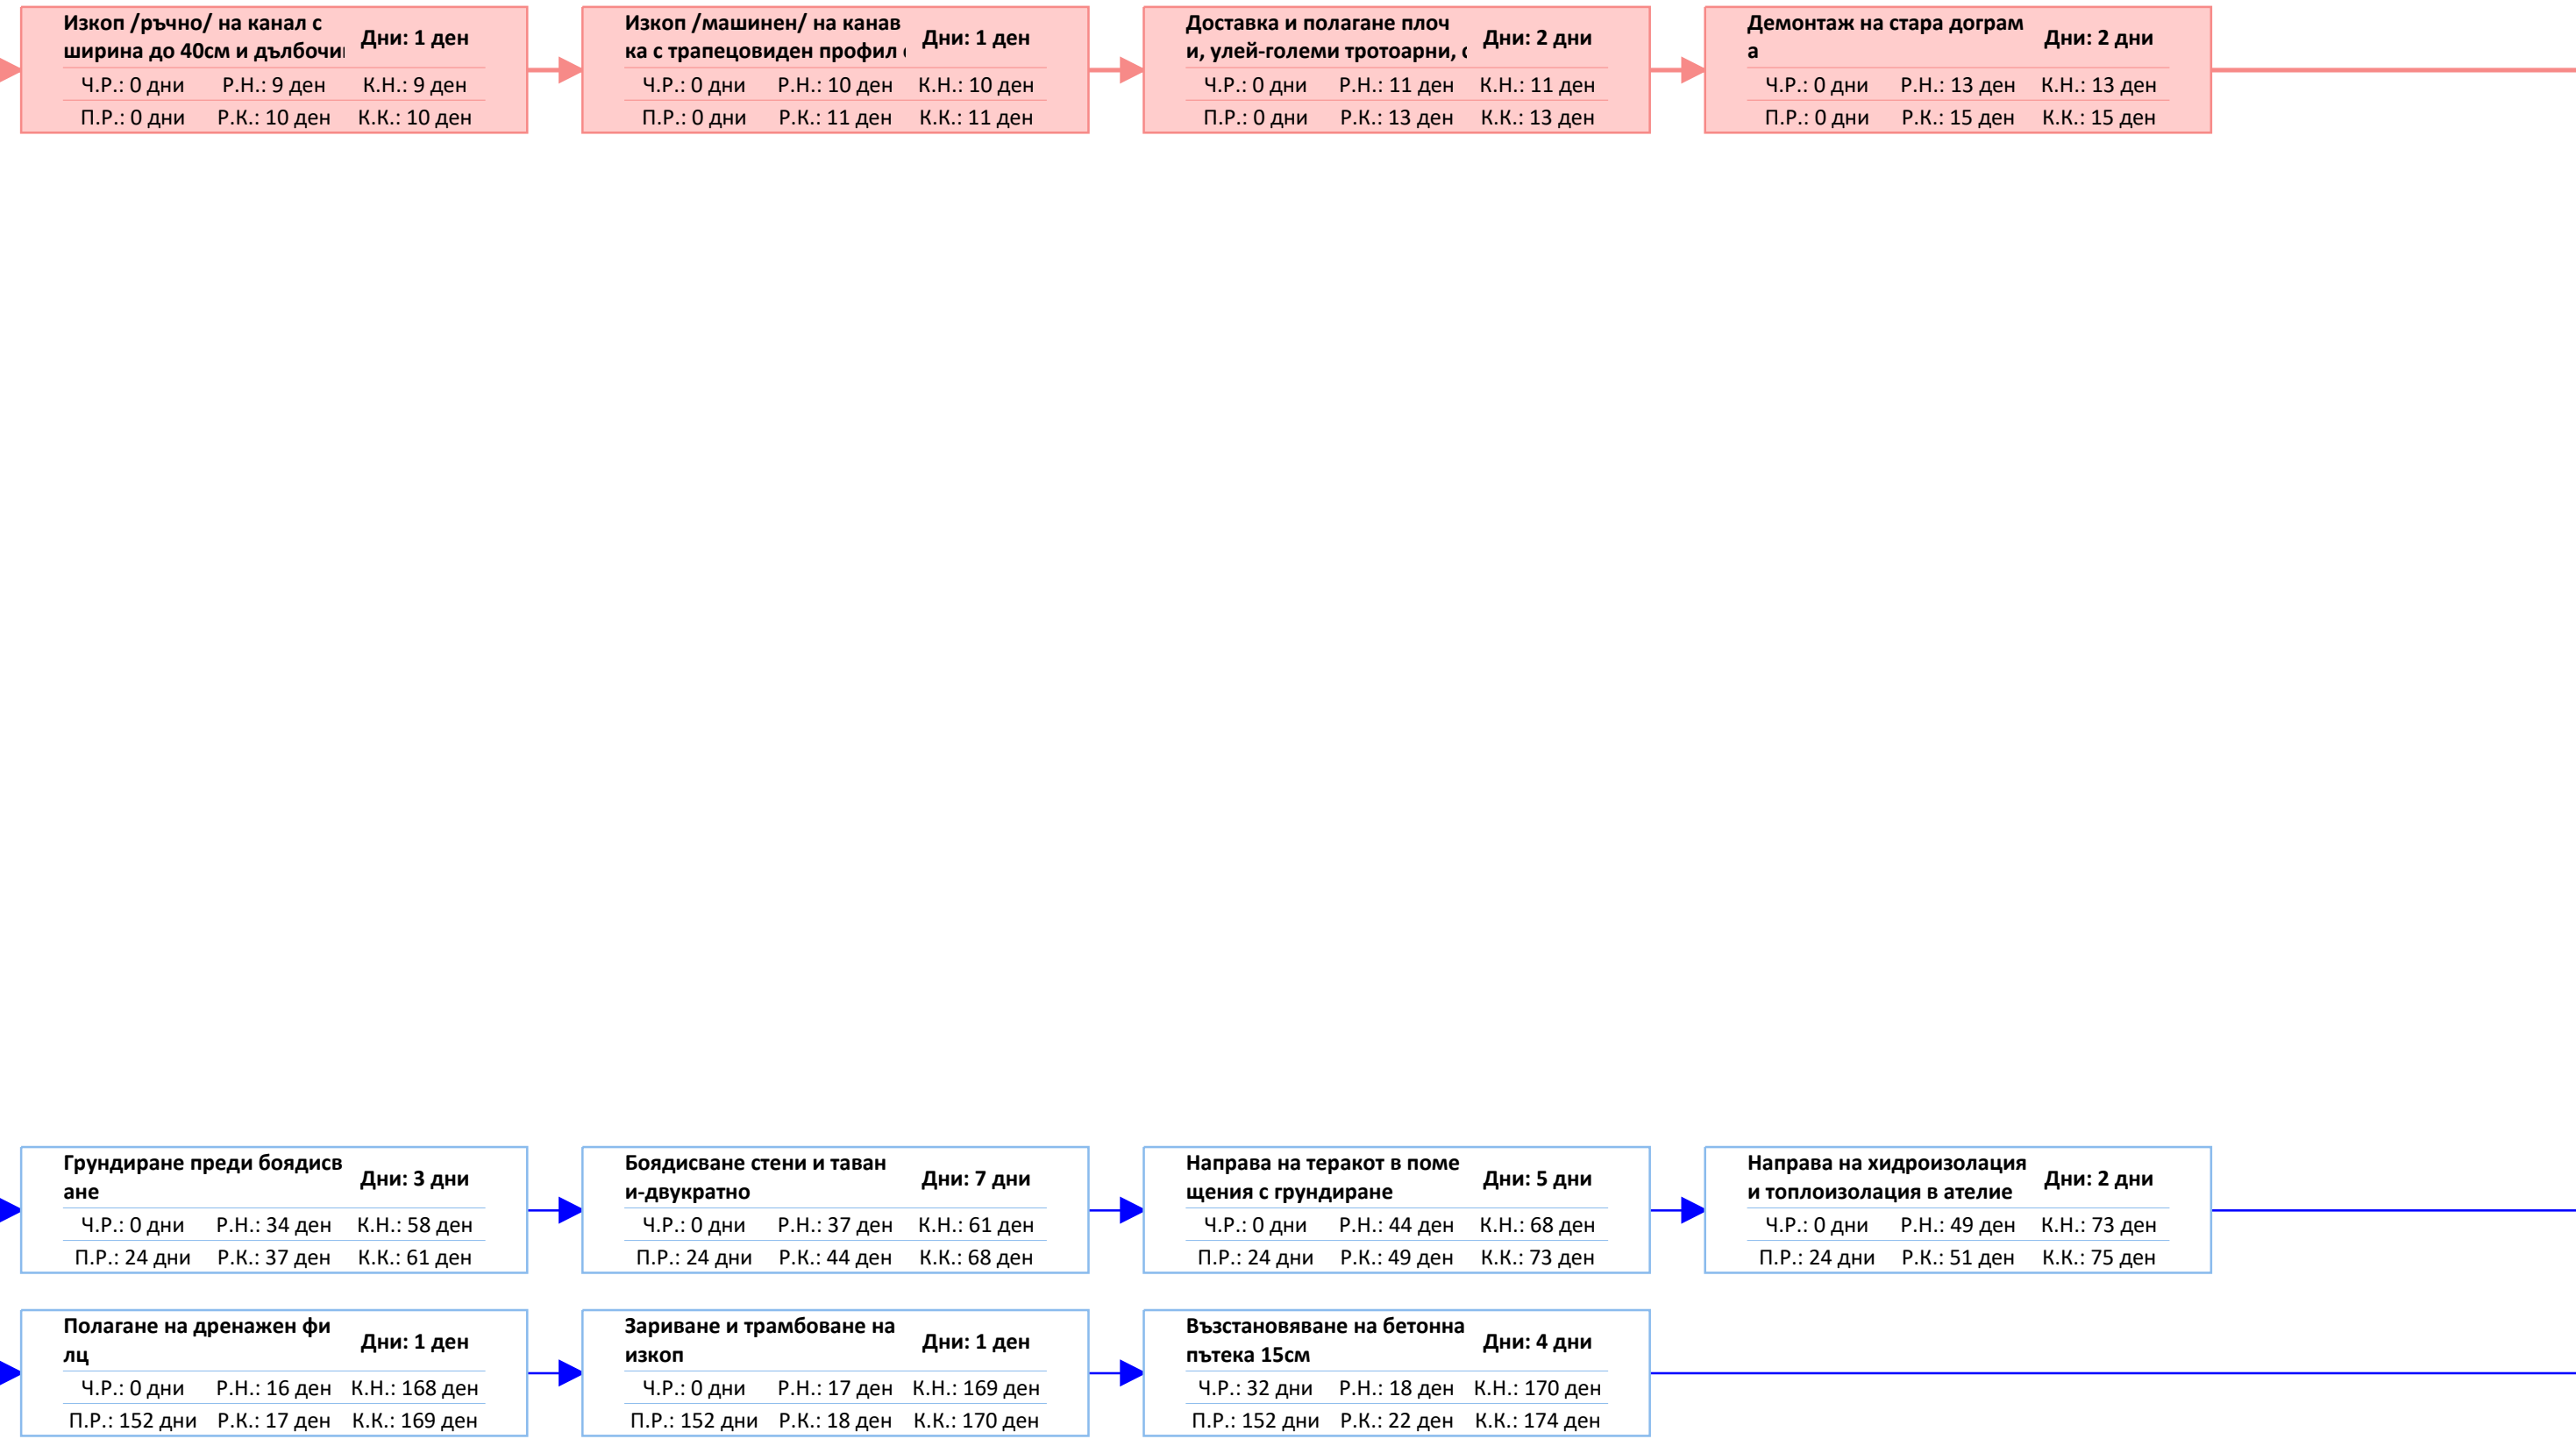

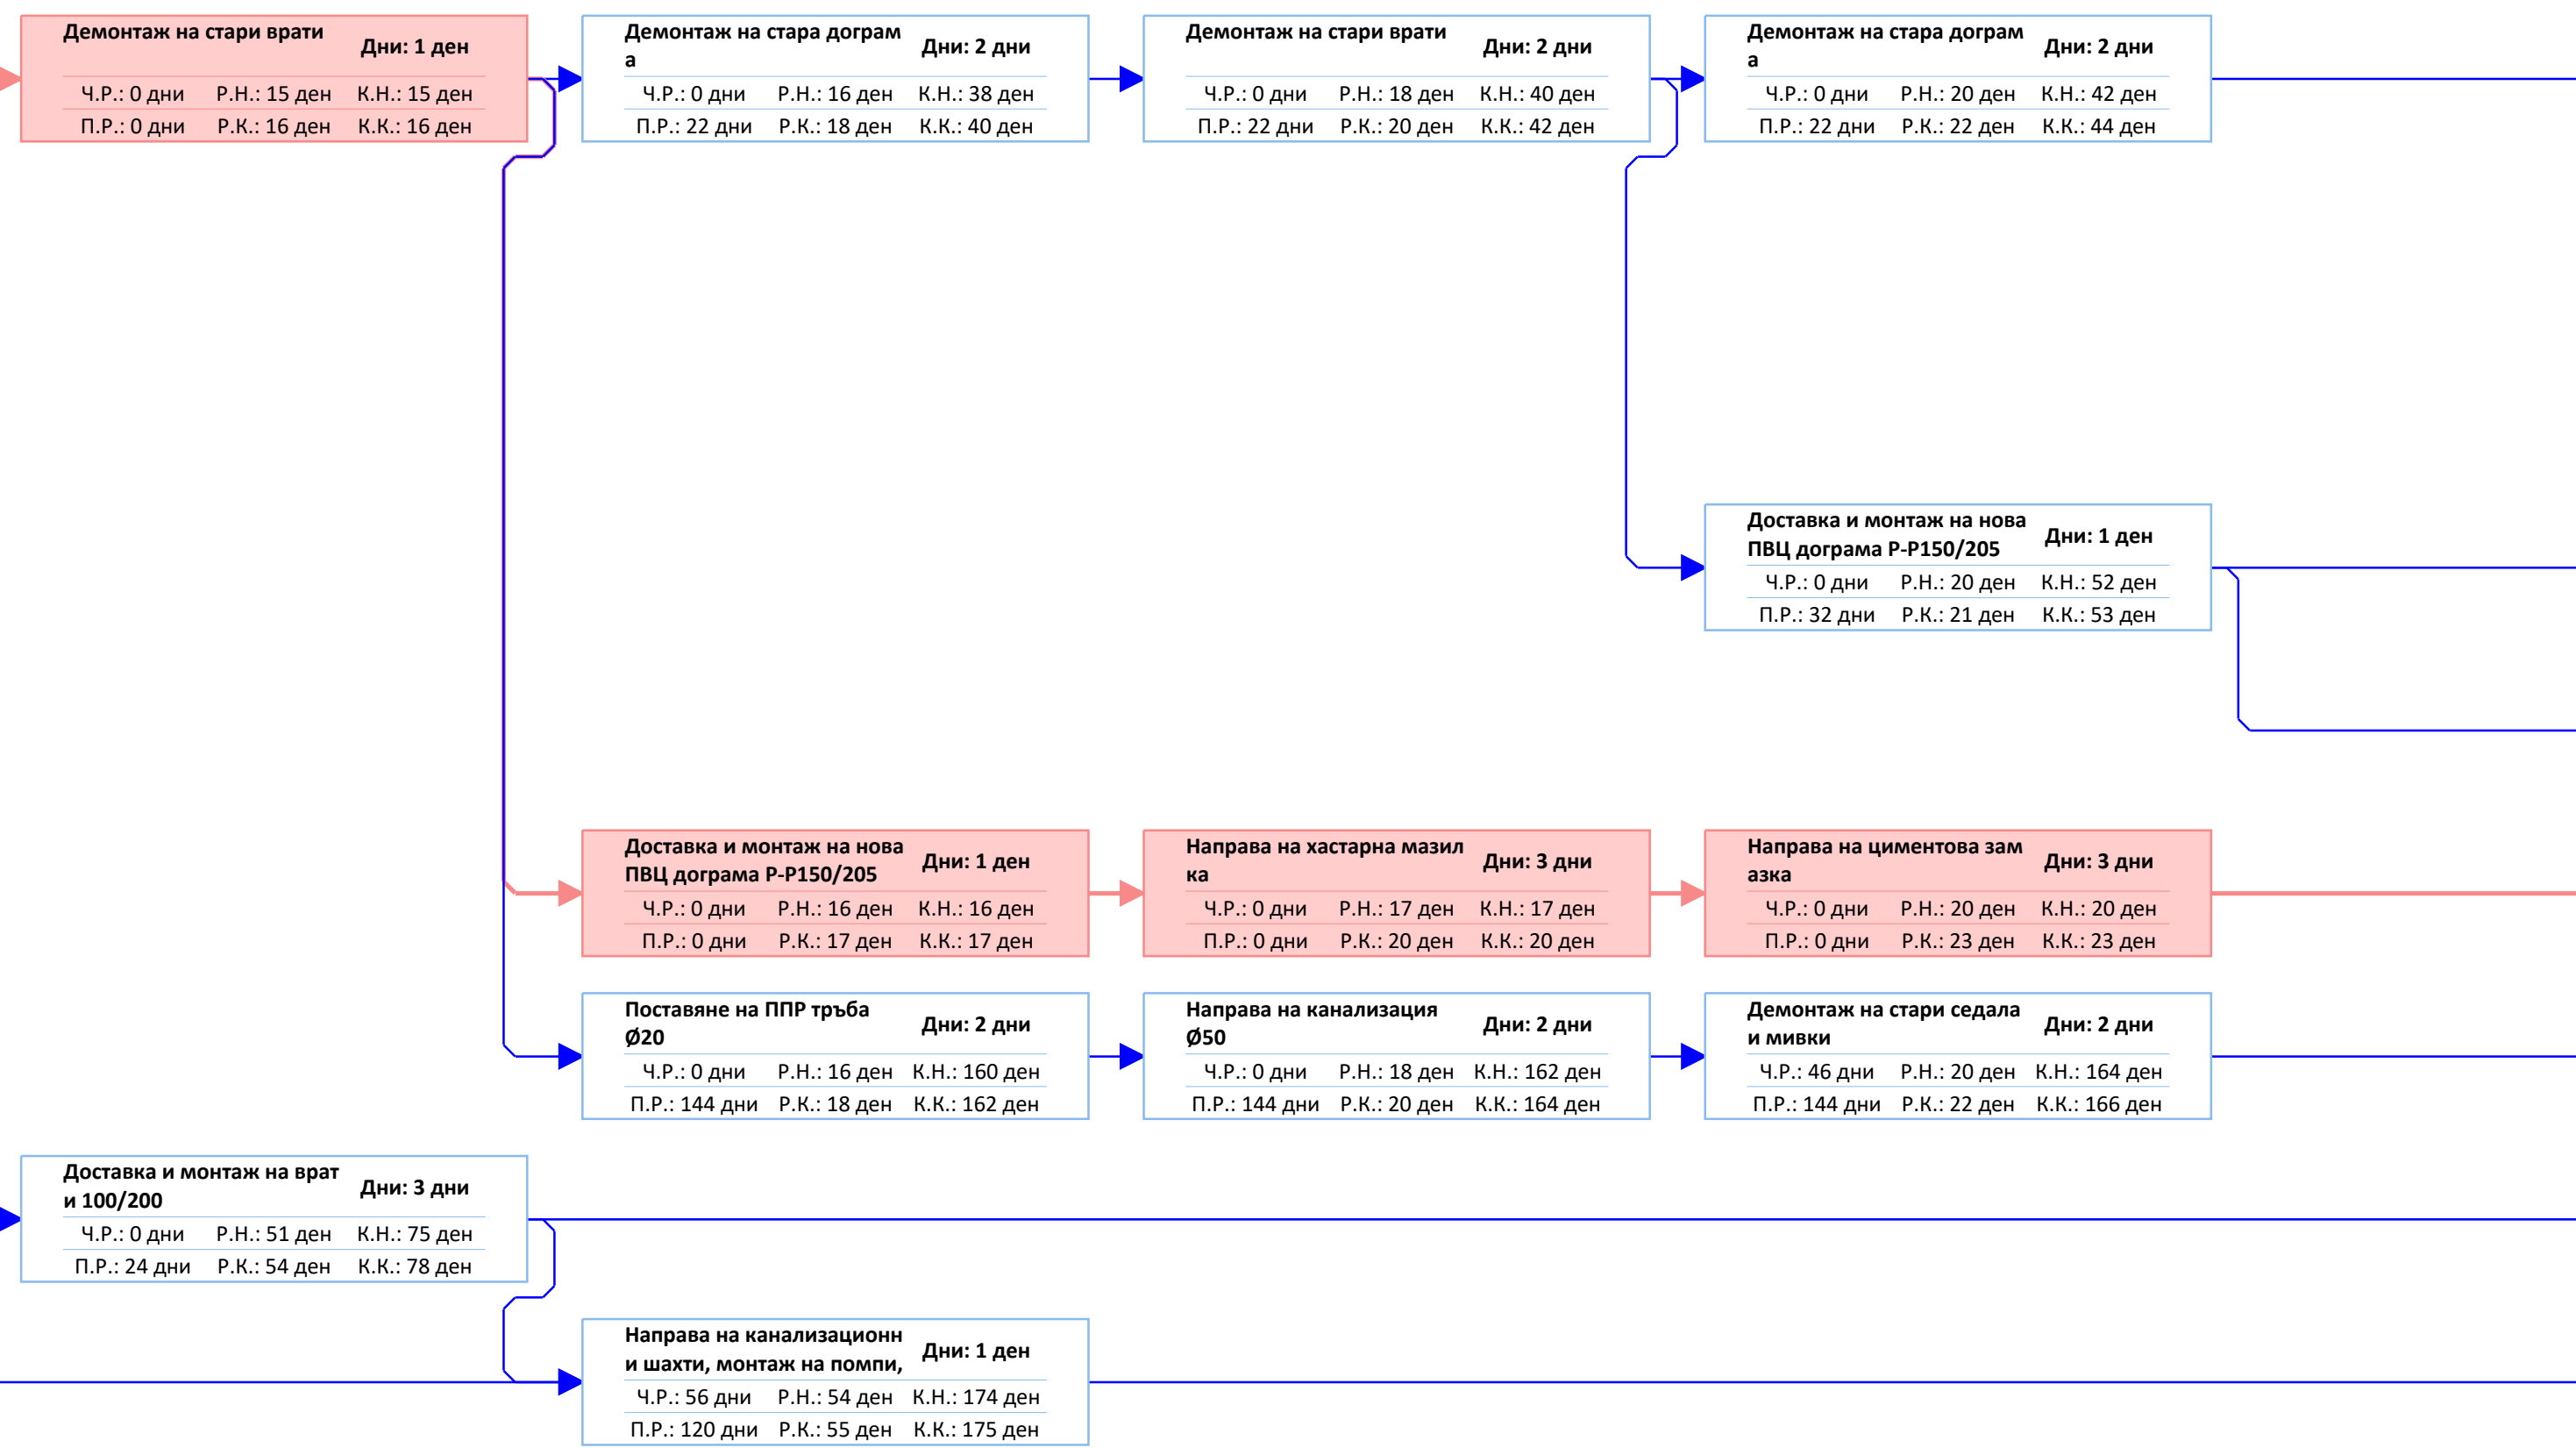

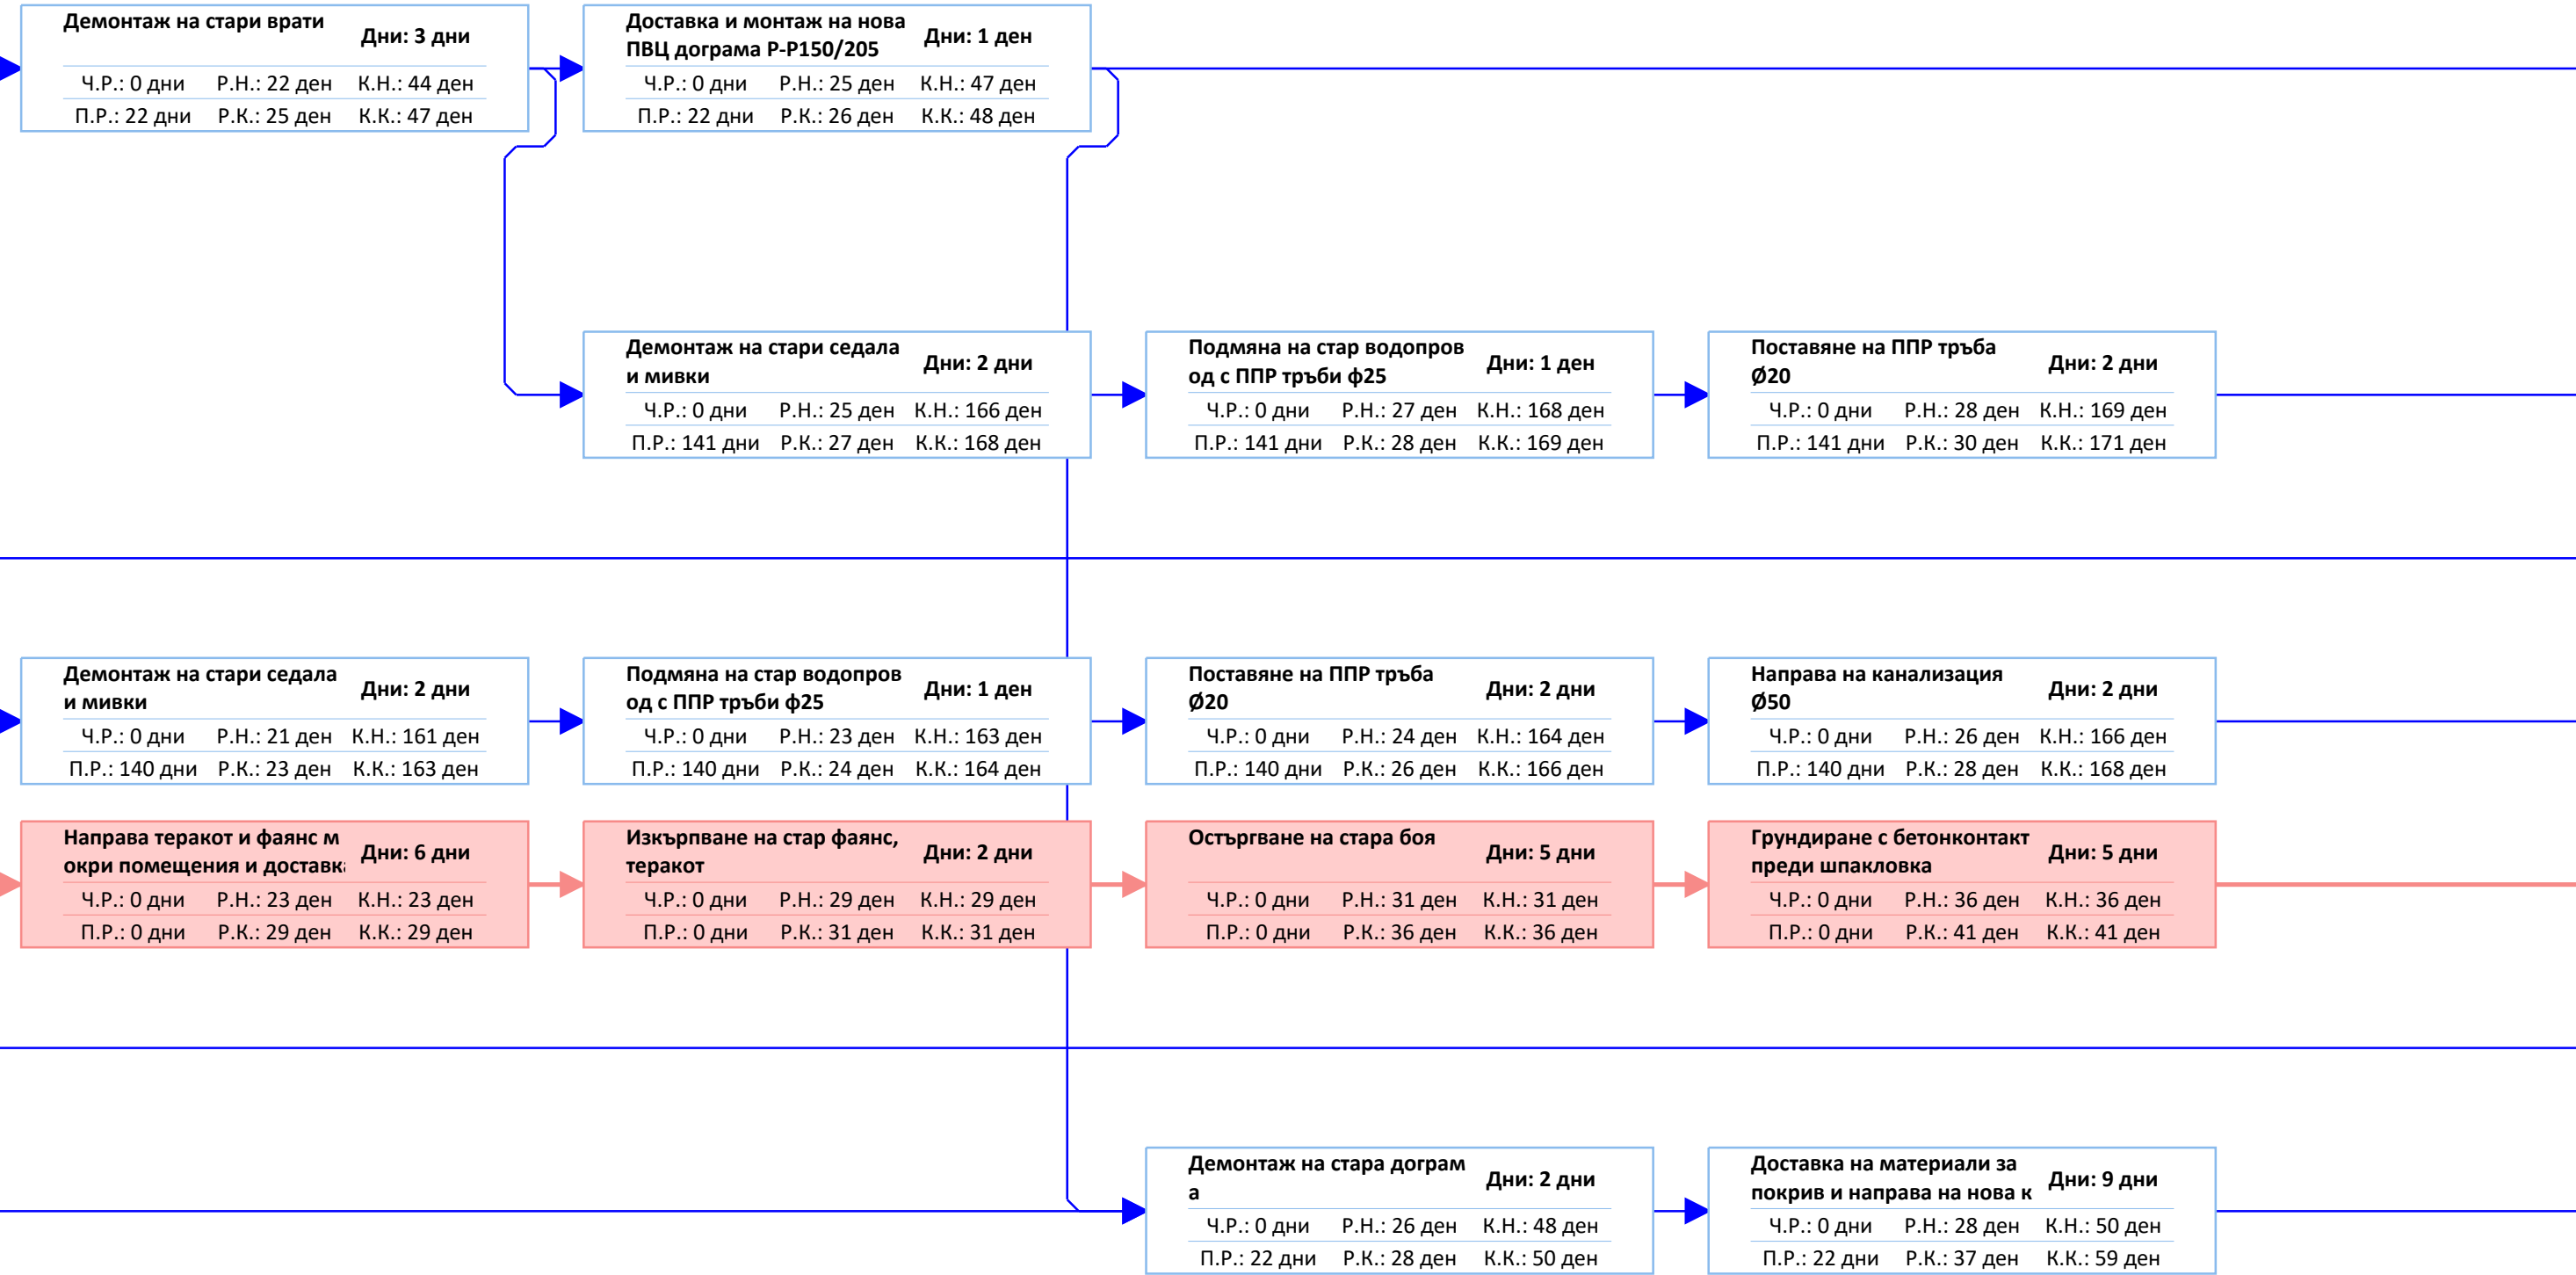

➡

Направа на канализация
ф50

Дни: 2 дни

Ч.Р.: 115 дни	Р.Н.: 30 ден	К.Н.: 171 ден
П.Р.: 141 дни	Р.К.: 32 ден	К.К.: 173 ден

➡

Подови сифони Ø50

Дни: 1 ден

Ч.Р.: 76 дни	Р.Н.: 28 ден	К.Н.: 168 ден
П.Р.: 140 дни	Р.К.: 29 ден	К.К.: 169 ден

➡

Направа на гипсова шпакл
овка

Дни: 9 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 41 ден	К.Н.: 41 ден
П.Р.: 0 дни	Р.К.: 50 ден	К.К.: 50 ден

➡

Направа на груд преди боя
дисване-дълбоко прониква

Дни: 4 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 50 ден	К.Н.: 50 ден
П.Р.: 0 дни	Р.К.: 54 ден	К.К.: 54 ден

➡

Боядисване тавани с латек
с-двукратно

Дни: 4 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 54 ден	К.Н.: 54 ден
П.Р.: 0 дни	Р.К.: 58 ден	К.К.: 58 ден

➡

Боядисване стени-двукрат
но

Дни: 5 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 58 ден	К.Н.: 58 ден
П.Р.: 0 дни	Р.К.: 63 ден	К.К.: 63 ден

➡

➡

Доставка и монтаж на нова
ПВЦ дограма 150/130

Дни: 2 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 37 ден	К.Н.: 59 ден
П.Р.: 22 дни	Р.К.: 39 ден	К.К.: 61 ден

➡

Монтаж скеле

Дни: 3 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 39 ден	К.Н.: 61 ден
П.Р.: 22 дни	Р.К.: 42 ден	К.К.: 64 ден

➡

Отстраняване на стара фас
адна мазилка до здраво

Дни: 3 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 42 ден	К.Н.: 64 ден
П.Р.: 22 дни	Р.К.: 45 ден	К.К.: 67 ден

➡

Отстраняване на стара боя
от стени и тавани

Дни: 2 дни

Ч.Р.: 0 дни	Р.Н.: 45 ден	К.Н.: 67 ден
П.Р.: 22 дни	Р.К.: 47 ден	К.К.: 69 ден

➡

